


順調に工事が進んでいます！

佐世保高架橋の海上部

佐世保競輪場付近の佐世保高架橋 海上部において、夜間に仮栈橋の設置作業を実施しています。その後、クレーンをこの仮栈橋上に配置して昼間施工を行います。

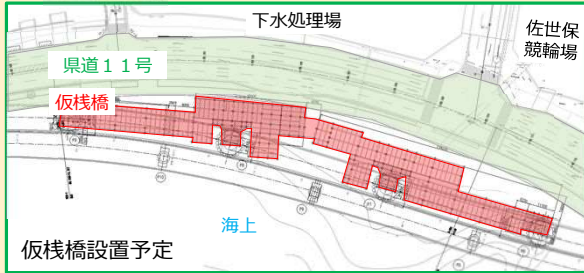

佐世保中央IC内橋梁部

本線と出入口に挟まれた箇所であるため走行車両への影響がないように細心の注意を行い作業を進めています。



沖新高架橋の夜間架設に伴う迂回路のご案内

佐世保高専付近に位置する沖新高架橋の橋桁架設工事に伴い、市道上空で作業を行うため周辺市道の通行止めを引き続き実施します。ご不便おかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。



工事(通行止め)予定						
規制パターン	令和4年			令和5年		
	12月	1月	2月	3月	4月	5月
①	5	8				2 5
②		1	1	2 3		12

※白抜き数字は通行止め日数
 ※土日祝日、年末年始、GW期間は通行止めを行いません。
 ※上記は予定であり、天候等により変更になる場合があります。
 週間予定については、右URLでご確認いただけます。




《佐世保高架橋拡幅工事の進捗状況 - 完成までの道のり -》



~NEWS TOPICS~

《新たに工事を2件契約しました》
 [令和4年度 佐世保道路 須崎橋他2橋(鋼上部工) 工事] 受注者: 日本車輛製造(株) 工期: 令和4年10月6日~令和6年8月25日
 [令和4年度 佐世保道路 佐世保高架橋南(鋼上部工) 工事] 受注者: 瀧上工業(株)・日本鉄塔工業(株)JV 工期: 令和4年11月16日~令和8年10月25日

《現場見学会を開催しました》
 普段は見る事ができないトンネルや橋梁など現場を見学していただきました。引き続き、他工事においても「現場見学会」を検討していきます。

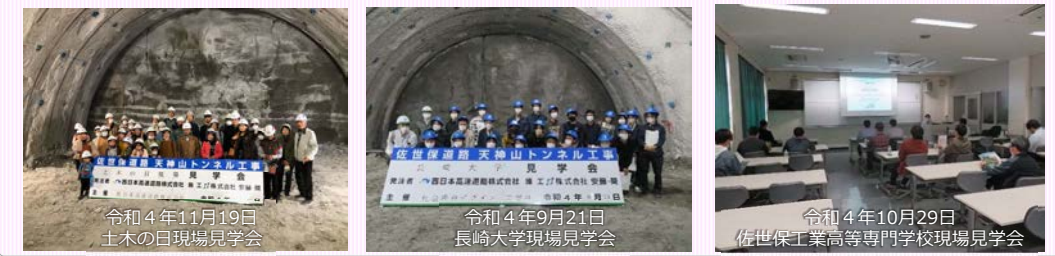

《弓張トンネル進捗状況》

掘削状況(令和4年11月末時点)
 西坑口より / 全延長 約2,200m / 2,671m

トンネル坑口(出入口) トンネル坑内 切羽

《天神山トンネル進捗状況》

掘削状況(令和4年11月末時点)
 東坑口より / 全延長 約570m / 909m

トンネル坑口(出入口) トンネル坑内 切羽
