

吉野川環境モニタリング調査実施計画

※平成28年3月30日現在

| 項目 | | 実施済み | | | | | | | | | | | | 今後の予定 | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------|---|-----|-------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|----------------------|--|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|--|----|-------------|--------------------|-----------------|------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| | | 事前調査 | | | | | | 工事中調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 平成26年 | | | 平成27年 | | | 平成28年 | | | 平成28年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
| 橋梁工事 | 下部工 | P1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 鋼管矢板基礎工施工中 | | | | | | | | |
| | | P2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 鋼管矢板基礎工施工中 | | | | | | | | |
| | | P3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 出水期のため 工事未実施 | | | | | | | | |
| | | P7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 浚渫工完了、鋼管矢板基礎工施工中 | | | | | | | |
| | 上部工 | P12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | P13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成28年度より順次実施 | | | | | | | | |
| | | P14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上部工 | | ●:実施済み ○:今後実施予定 | | | | | | | | | | | | ◀ ※下部工の完成に合わせて順次施工 ▶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 環境モニタリング調査 | 騒音・振動調査 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水質調査 | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | ● | | | ○ | | | ○ | 定期水質、工事中水質、海苔養殖 | | | | | | | | | |
| | 地形調査 | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ 深浅測量、航空レーザー測量 | | | | | | | | | |
| | 底生生物・底質調査 | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ 潮下帯定量、潮間帯定量、付着生物 | | | | | | | | | |
| | 鳥類調査 | | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ 飛翔状況、生息状況 | | | | | | | | | |
| 魚類調査 | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ 刺網、サーフネット | | | | | | | | | | |
| 検討会・部会 | 検討会 | | ■第5回 (H27.4.27) ・橋梁設計の報告(景観の検討結果を含む) ・調査計画のブラッシュアップの中間報告 | | | | | | | | | | | | ■第6回 (H27.10.27) ・事前調査結果の報告(速報)(H26.9~H27.6) ・工事中調査計画の確認 | | | | | | | | | | | | ■第7回 (H28.6頃開催予定) ・事前調査結果の報告(H26.9~H27.10) ・工事中調査結果の報告(H27.11~H28.1予定) | | | | | | | | | | | | |
| | 環境部会 | | ■第4回 (H26.12.15) ・吉野川河口域の生物観察データの活用 | | | | | | | | | | | | ■第6回 (H27.10.2) ・事前調査結果の報告(速報)(H26.9~H27.6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ※環境モニタリング調査については、 適宜、各委員に確認する。 ※検討課題が生じた場合に、随時開催する。 |
| | 橋梁部会 | | ■第5回 (H27.2.24) ・事前調査結果の報告(速報)(H26.9~H26.10) ・調査計画のブラッシュアップ | | | | | | | | | | | | ・事前調査計画に基づく工事中調査計画の妥当性の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ※橋梁設計については、 適宜、各委員に確認する。 ※検討課題が生じた場合に、随時開催する。 |


工事施工状況

平成28年1月～3月

■ 工事施工状況



【浚渫状況】

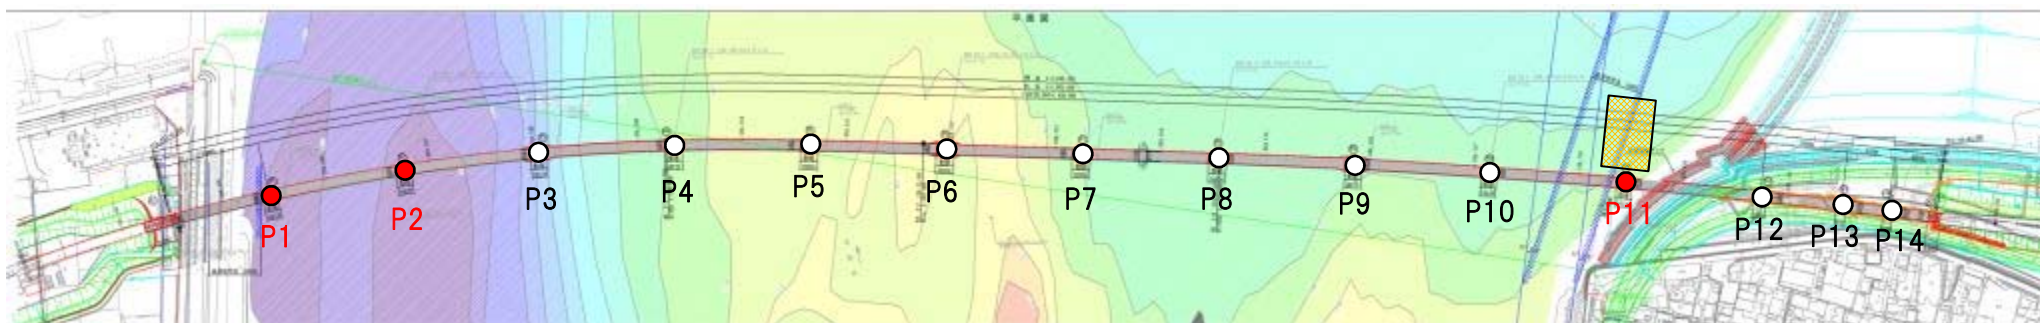

● : 施工中箇所
○ : 未施工箇所



環境モニタリング調査実施状況

平成28年1月～3月

■環境モニタリング調査実施状況



■鳥類調査

調査実施日：平成28年1月25日

■騒音・振動調査

調査実施日：平成28年1月25日、杭打ち作業日



■環境モニタリング調査実施状況



■水質調査

調査実施日：平成28年3月23日、工事稼働日

