

事業説明会を開催



昨年11月18日に中津市文化会館において、東九州自動車道（椎田南IC～宇佐IC）における事業説明会を開催致しました。

地元の方をはじめとする一般の方々にも参加していただき、当該区間の整備に関し、事業の目的や内容等について、理解を深めていただきました。

1日でも早く供用できるよう事業の進捗を図ってまいります。

地域イベントの参加

諭吉の里「なかつ」ハーフマラソン・ウォーキング
豊前天地山ジョギング 上毛町駅伝



昨年11月27日『諭吉の里「なかつ」ハーフマラソン・ウォーキング』、12月4日『豊前天地山ジョギング』、1月15日『上毛町駅伝』の各地元イベントに参加し、青空のもと地元の皆さまと一緒に走り汗を流しました。

また、交通事故ゼロを目指すDRIVE&LOVEプロジェクトの広報活動も行い、ご好評をいただき、ありがとうございました。

今後も地元主催のイベントに積極的に参加いたします。


出前講座のご案内

中津工事事務所では、高速道路事業を少しでもご理解して頂き、身近に感じて頂けるよう出前講座を順次受け付けております。出前講座の内容は、高速道路の建設に関わる事項や緑化の取り組み等です。また工事現場の見学会も実施しています。対象は、地域住民の皆様、官公庁、学校等の高速道路事業に興味がある団体としております。お申し込みをお待ちしております。

担当部署：中津工事事務所 工務課

お問合せ先（発行）

西日本高速道路株式会社 九州支社
中津工事事務所
〒871-0024
大分県中津市中央町1-5-16
大分県中津総合庁舎附属棟
TEL 0979-25-2333 FAX 0979-25-2030
<http://www.w-nexco.co.jp>



～『189万人の思いを乗せて』とは～

東九州自動車道の早期開通を要する沿線住民の方々から集まった署名数が『189万人』であり、この沿線住民の方々からの熱い思いを受け、『189万人の思いを乗せて』と名付けました。



みち、ひと、未来へ。 Highway Letter 東九州道

～189万人の思いを乗せて～

Vol. 8

西日本高速道路(株)
九州支社
中津工事事務所

～ 友枝川橋 ～



佐井川橋（鋼上部工）工事がしゅん功！！
友枝川橋にて現場見学会を実施！！

今月、佐井川橋（鋼上部工）工事（請負人：日立造船(株)）がしゅん功を迎えました。これで中津工事事務所では、昨年末にしゅん功した舟入川橋（下部工）工事（請負人：(株)松本組）に続き3工事目のしゅん功となります。当該区間では、初めての上部工工事のしゅん功となり、佐井川及び友枝川に架かる2橋が完成しました。

友枝川橋の完成に伴い、1月12日～14日には友枝小学校・南吉富小学校・唐原小学校の皆さまや地元の皆さま総勢190名を招いて、見学会を実施しました。見学会では、橋の上から上毛町の風景をご覧いただいたほか、小学生には床版にお絵書きや願い事を書いてもらいました。皆さまからいただいたメッセージ等の期待に応えられるよう、早期開通を目指して鋭意事業を進めてまいります。




※橋梁名称は全て仮称です



平成24年1月発行

1. 工事進捗状況

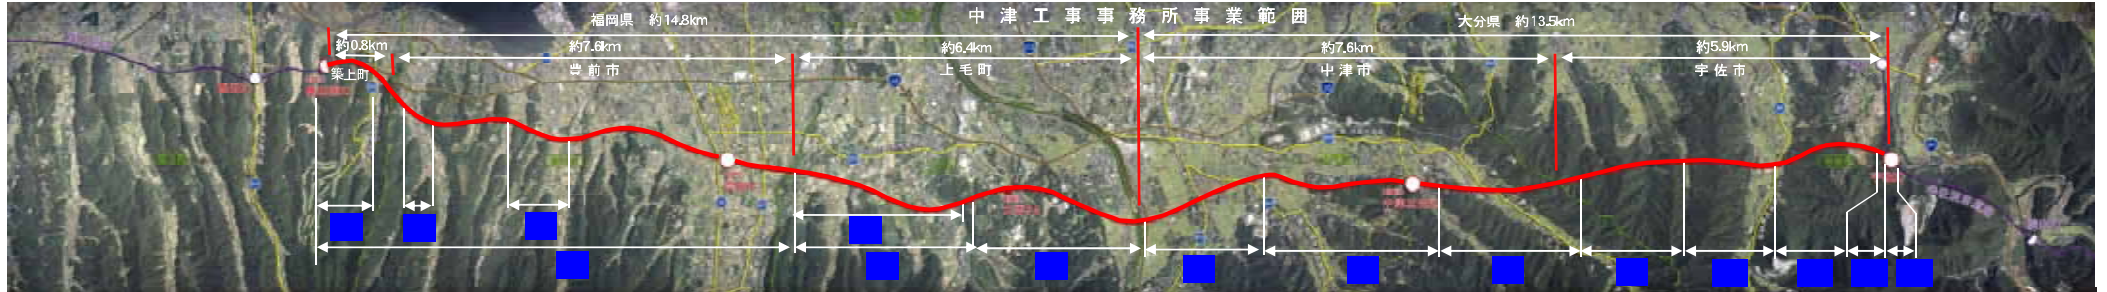

豊前工事区(築上町～豊前市)

下部工工事がしゅん功しました！！

舟入川橋（下部工）工事（請負人：榊本組）が2月に無事しゅん功しました。豊前市域で最初に着手した工事であり、角田校区、山田校区の地元住民の皆様にご迷惑をお掛けしながらも、皆様のご理解・ご協力のおかげでしゅん功できました。ありがとうございます。当該工事で下部工を建設しました4橋梁のうち、角田川橋は完成し、川内橋、中川橋については桁の架設まではすべて完了し、床版、付属物の施工を進めています。

また、築上町域で工事を進めています上ノ河内川橋（下部工）工事（請負人：松山建設機）についても2月末の完成に向けて鋭意施工を進めています。



舟入川橋(下部工)工事
施工完了状況



上ノ河内川橋施工状況

上毛工事区(上毛町)

山国川橋の橋脚の工事を進めています！！

福岡県と大分県の県境である山国川に橋脚を施工しています。現在、川を汚さずに橋脚を施工するための仕切りとなる矢板を打込む作業を行っています。河床には玉石が点在しており、矢板の打込みが大変難しい施工となっていますが、早期の施工完了を目指し日々頑張っています。

また佐井川橋（鋼上部工）工事がしゅん功を迎え、上毛工事区では2工事目のしゅん功となりました。友枝川橋の完成に伴い、これから唐原トンネルに着手します。唐原トンネルは国指定史跡である唐原山城跡の下を通り抜ける低土被りの特殊なトンネルです。延長は243mと短いですが、安全に努め施工を進めています。



山国川橋施工状況



友枝川橋

中津工事区(中津市)

トンネル掘削を開始します！！

いよいよ今月末から中津トンネルに着手します。今回トンネル掘削を行う山は、主に火山岩と多量の火山灰からなる凝灰角礫岩で形成されています。この凝灰角礫岩は、機械掘削に適した岩であり、今回ロードヘッダーと呼ばれる掘削機械により山を削りながら掘り進む計画です。

現在、トンネルを掘るための設備を準備しているところで、設備が整い次第、掘削に着手する予定です。

トンネル掘削が進むと、昼間でも光の届かない場所での作業となりますが、事故なく早期に貫通出来るよう安全に工事を進めてまいります。



トンネル坑口箇所



掘削機械：ロードヘッダー

宇佐工事区(宇佐市)

宇佐高架橋の一部の橋脚が完成しました！！

施工中の東九州自動車道と共用中の宇佐別府道路が接続する箇所位置する宇佐高架橋のP1橋脚及びA1橋脚が完成し、来月にはP2橋脚及びA2橋脚が完成します。その後、上部工の施工を開始する予定です。また、赤尾第二トンネルにおいては10月24日より掘削を開始し、1月26日現在213m掘削しています。順調に掘削が進めば、今年の春頃に貫通する予定です。その後、赤尾第一トンネル(約600m)の掘削を行う予定です。写真はトンネル坑内の様子を写したものです。

また、宇佐工事については、土運搬が全盛期を迎えますので、引き続き安全管理に努めながら施工を行ってまいります。



宇佐高架橋施工状況



赤尾第二トンネル施工状況

2. 用地進捗状況

H24.1末時点

市町村名 (km)	福岡県										
	築上町 0.8	豊前市 7.6				上毛町 6.4					
地区名 (km)	西角田 0.8	角田 2.2	山田 1.6	大村・千束 1.9	横武・黒土 1.9	緒方・矢方・尻高 1.0	安雲・宇野 0.7	土佐井・下田井・新谷 1.5	下唐原 1.6	上唐原北 0.6	上唐原南 1.0
用地取得率	100%	92%				94%					95%

市町村名 (km)	大分県														
	中津市 7.6					宇佐市 5.9									
地区名 (km)	土田 0.3	佐知 0.3	諫山 1.0	原口 0.5	成恒 0.4	田口・森山 1.0	西秣 2.1	上秣 0.9	下深水 1.2	上今仁 0.8	赤尾 2.1	今成 1.0	木内 0.4	末 0.6	山本 1.0
用地取得率	98%					97%					96%				

3. 工事発注状況

H24.1末時点

番号	工事名	請負会社	工期	進捗率
①	上ノ河内川橋(下部工)工事	松山建設機	平成22年1月21日～平成24年2月29日	92.1%
	上ノ河内川橋(PC上部工)工事	榊本組	平成23年3月30日～平成25年11月13日	2.2%
②	舟入川(下部工)工事	榊本組	平成21年8月5日～平成23年12月10日	しゅん功
	舟入川(鋼上部工)工事	宇部興産機械機	平成22年7月21日～平成24年1月10日	58.0%
③	豊前工事	奥村組土木興業機	平成22年12月16日～平成26年3月29日	2.5%
④	安雲工事	榊本組	平成20年12月9日～平成22年10月29日	しゅん功
⑤	上毛西工事	藤島建設機	平成22年11月2日～平成26年2月13日	9.0%
	佐井川橋(鋼上部工)工事	日立造船機	平成21年11月26日～平成24年1月14日	しゅん功
⑥	上毛東工事	榊本組	平成23年4月19日～平成26年7月1日	1.0%
	山国川橋(鋼上部工)工事	片山又ラック機	平成23年9月21日～平成25年12月8日	0.0%
⑦	中津工事	榊本組	平成23年8月2日～平成26年5月17日	0.0%
⑧	中津三光インターチェンジ工事	清水建設機	平成22年10月16日～平成25年11月28日	5.0%
	中津トンネル工事	榊本組	平成21年11月20日～平成25年4月2日	18.8%
⑨	西秣第一橋(鋼上部工)工事	海上工業機	平成23年11月2日～平成26年4月19日	0.0%
	赤尾第一トンネル工事	榊本組	平成22年1月28日～平成25年11月7日	30.1%
⑩	赤尾第三トンネル工事	榊本組	平成21年3月26日～平成24年2月8日	99.9%
⑪	伊弉波川高架橋(PC上部工)工事	榊本組	平成23年8月5日～平成26年1月20日	0.0%
	宇佐工事	大成建設機	平成22年10月28日～平成26年7月8日	8.7%
	宇佐高架橋(鋼上部工)工事	宇部興産機械機	平成23年2月23日～平成25年6月11日	19.7%
	山本工事	榊本組	平成22年3月5日～平成24年4月22日	74.5%
