





長崎自動車道(東脊振IC～佐賀大和IC)


○令和3年8月16日(月) 16時2分～ 令和3年8月20日(金) 6時



○令和3年8月20日(金) 6時～ 令和3年12月9日(木) 12時

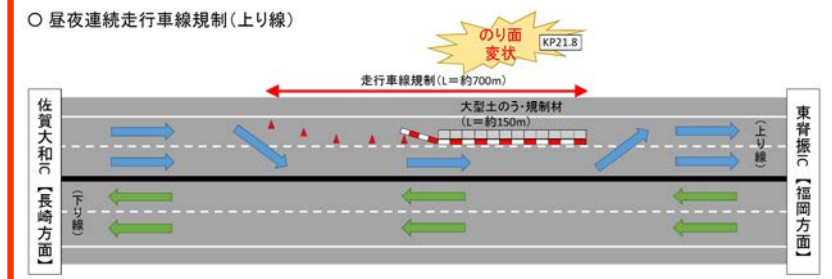

○令和3年12月9日(木) 12時～

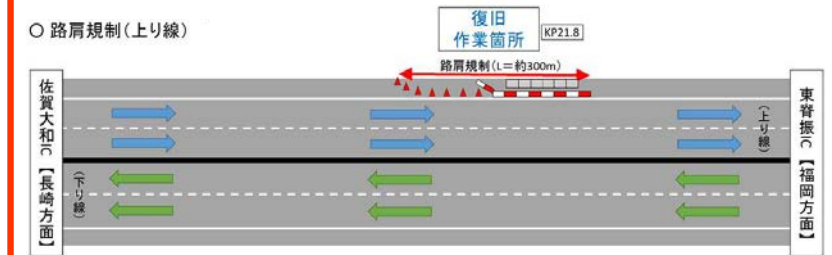


復旧工事期間中、走行車線規制を行うことがあります。

《被災以降にこれまで実施した対策》

- 変状箇所全面に雨水の浸入防止のためシートを設置。大型土のうによる防護を実施して通行止めを解除。
- 本復旧工事の工法検討のため、コンクリート吹付の打音調査、ボーリング調査(4箇所)を実施するとともに、今後の本復旧工事の防護工として仮設落石防護柵を設置。併せて、走行車線規制を解除し、2車線を確保。


《今後の本復旧工事の内容》

- 損傷したコンクリート吹付工の補修・補強工事を実施予定。

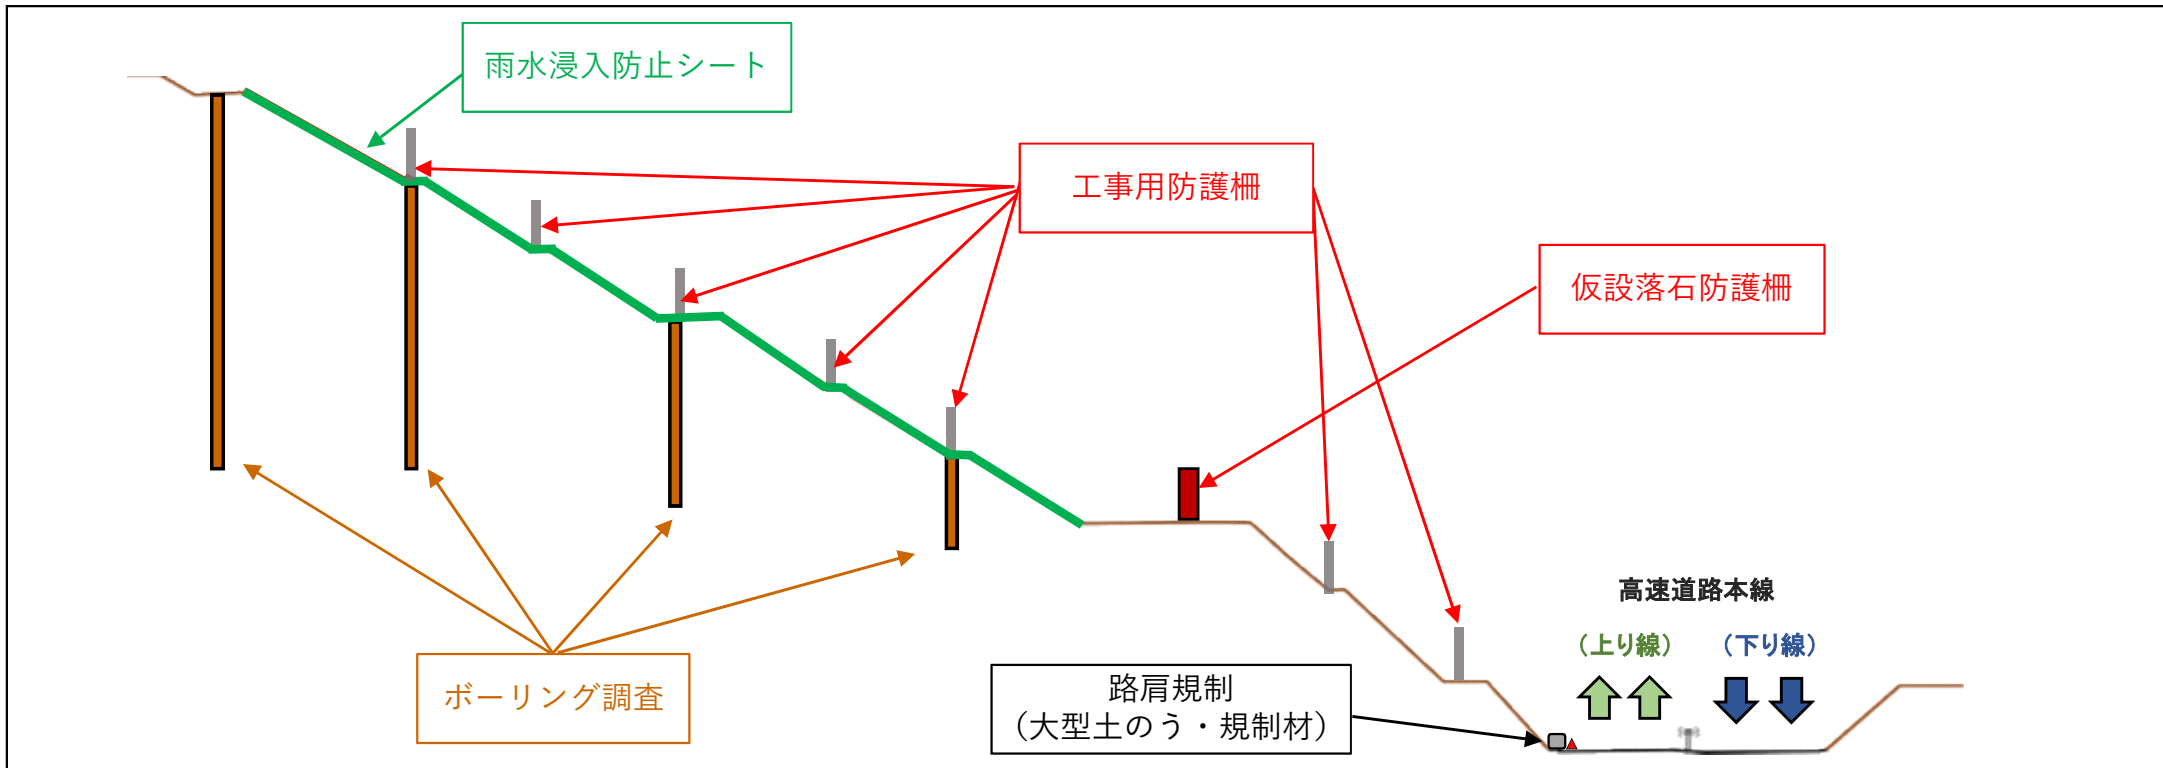

長崎自動車道(東脊振IC～佐賀大和IC)の復旧状況

①令和3年8月20日6時 通行止め解除

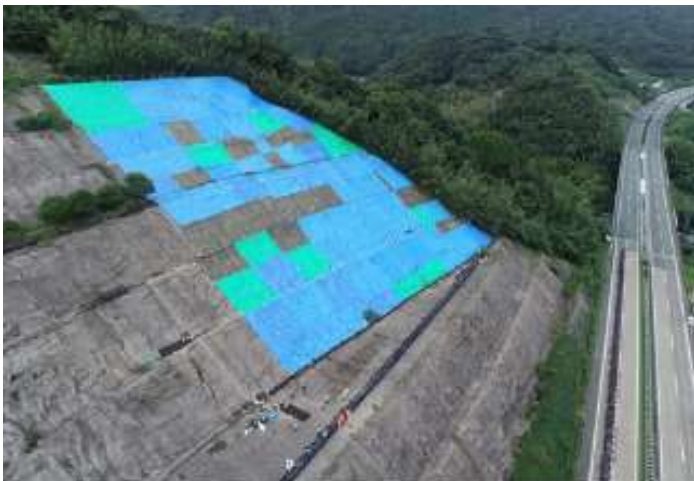

雨水の浸入防止のためシートを設置。

②ボーリング調査・打音調査状況



③仮設落石防護柵施工状況



のり面変状箇所の本復旧工事のため仮設落石防護柵を設置。

④令和3年12月6日現在の状況



昼夜連続走行車線規制から路肩規制へ切り替え。今後、落石防護柵内で本復旧工事を実施予定。
