工事担当者にお聞きしました

淀川橋工事は、新名神高速道路（八幡～高槻）のうち、淀川に架設する PC 橋の上下部工事です。橋梁形式は PRC7 径間連続エクストラドーズド箱桁橋で橋長は 920m、最大支間長は 210m、全幅は 35.4m の６車線一括断面です。本工事で施工する橋脚は７基あり基礎形式は鋼管矢板基礎３基、鋼管ソイルセメント杭基礎４基となります。

下部工施工は、河川内は非出水期施工で工程上の制約がある中、最後の P10 橋脚が、令和７年５月に完了しました。

上部工施工は現在、枚方側の P9 橋脚は張出 14BL 中 9BL まで完了、高槻側の P14 橋脚は張出 13BL 中 10BL 目を施工中で、その他の橋脚は、柱頭部と主塔の施工を行っています。工事が上部工施工に移ったことで、迫力のある橋梁の形が徐々に見えてきている状況です。

本工事は、架橋地点が鵜殿ヨシ原を跨いでおり工事中は周辺環境へ配慮しながら施工を行うにあたり、淀川環境に詳しい学識経験者の助言を受け、関係者の皆様と連携を図り、環境保全対策を実施するとともに、近隣住民の方々のご理解とご協力を頂きながら施工を進めて参ります。

安全に関しては、過去の事故を教訓とし、コミュニケーション向上、危険感受性の向上を図り、JV 職員が主体的に現場従事者への指導を行い安全管理に努めて参ります。

新名神高速道路
淀川橋工事
三井住友建設（株）・
（株）竹中土木・極東興和（株）共同企業体
現場代理人　鈴木　正敏

高槻IC～茨木千提寺IC間通行止め

橋梁上部工工事を安全に実施するため、令和７年度についても継続して高槻 IC ～茨木千提寺 IC 間の夜間通行止めを行う予定です。ご不便とご迷惑をおかけいたしますが何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

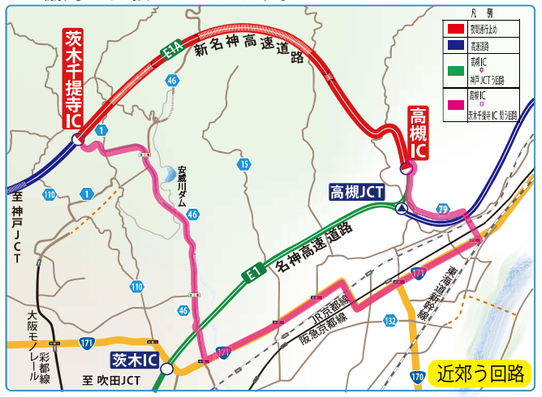

規制予定区間	令和7年度（2025年度）												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
E1A 新名神 高槻ＩＣ～茨木千提寺ＩＣ	下り線夜間通行止め	GW		上り線夜間通行止め	お盆 上り線夜間通行止め	下り線夜間通行止め	下り線夜間通行止め予定	計画検討中 工事・交通規制	年末年始	計画検討中 工事・交通規制			

「第 56 回市民フェスタ高槻まつり」ブース出展

令和7年8月2日（土）、8月3日（日）に、高槻市主催「第56回市民フェスタ高槻まつり」に参加し、パネルや模型を用いた事業PRを実施することができました。

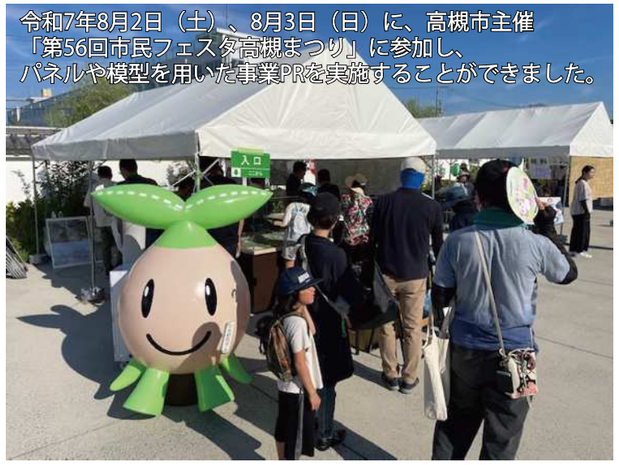

大谷川橋（鋼上部工）工事がしゅん功しました

1級河川の大谷川及び一般道を横過する鋼上部工工事が８月にしゅん功しました。

夏期実習生現場見学会

令和7年8月20日（水）に、夏期実習生約40名に対して現場見学会を実施しました。

西日本高速道路 関西支社
新名神大阪西事務所
〒569-1133　大阪府高槻市川西町 2-10-20
TEL 072-655-9900　FAX 072-655-9901

https://corp.w-nexco.co.jp

「新名神大阪だより」
バックナンバーはこちら！

西日本高速道路 関西支社
新名神大阪東事務所
〒573-1171　大阪府枚方市三栗 2-5-1
TEL 072-809-4740　FAX 072-809-4741

新名神大阪だより

令和７年度 秋号

みち、ひと・・・未来へ。
NEXCO 西日本

2025年 8月 25日撮影

新名神高速道路　淀川橋工事
